

垫丰武高速公路 TJ03标调研记录 0509

2026年5月9日

验证沟通对象：技术质量部——袁操

1. 核心判断

并不是有痛点主动找工具，而是总工授权+BIM应用要求。先用形象进度展示和汇报成果建立客户感知，再用计划偏差分析证明管理价值，最后再验证自动排程是否值得深入。

2. 后续验证验证重点

2.1 项目关键角色验证

项目总工（是否真的需要重点工程进度风险判断？是否愿意用系统成果做管理决策？）、工程部长、计划员（月周计划编制、调整、统计到底耗不耗时间？哪些环节最烦？）、施工员（实际进度上报是否愿意按结构部位填？填报成本能不能接受？）

2.2 现有excel表格验证

总控计划、年度计划、月计划、周计划、每日施工群汇报样例、工程部进度统计表、项目汇报PPT或周例会材料；

2.3 计划调整场景

最近一次重排是什么原因？重排用了多久？谁来做？重排时主要改哪些内容？是改总控、年度、月计划，还是只改局部？重排后怎么通知分包和现场？重排是否会重新测算关键节点？

2.4 实际进度统计

分包怎么报？工程部怎么汇总？汇总到什么表？是否需要重复录入？是否要转成汇报材料？是否要按桥、隧、路、工区、分包分别统计？周报、月报、业主汇报是不是不同口径？统计数据是否和施工日志、计量数据存在差异？

3. MVP节奏


建模 → 生成计划 → 录入实际 → 看偏差 → 出汇报。

验证沟通纪要：

1. 当前形象进度展示效果反馈

本次演示汇报了当前项目的形象进度展示效果。袁对当前展示成果整体认可，认为以目前项目条件和产品能力来看，已经基本达到预期效果。

其主要认可点集中在汇报价值上，认为更适合面向甲方、公司进行项目进度汇报展示。可以将当前进度结果及系统截图整理后，用于项目实际进度汇报材料。

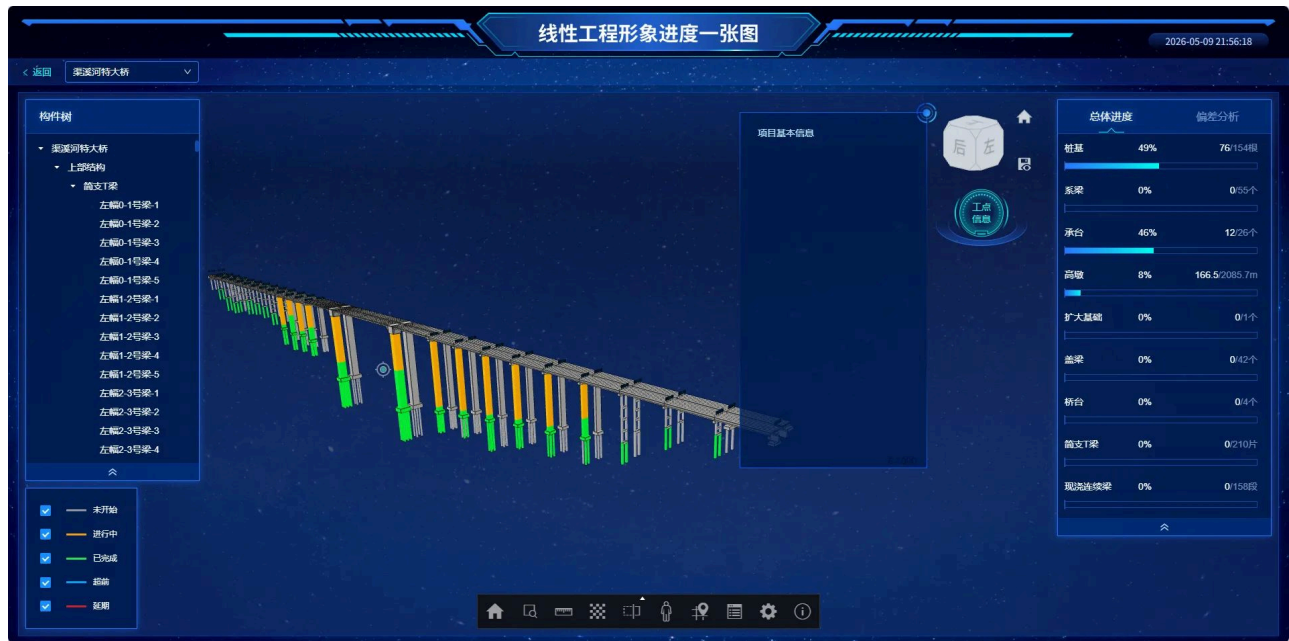

2. 关键工程计划编制颗粒度

针对关键工程的计划编制颗粒度进行了讨论。

从汇报场景看，计划或统计结果通常按照结构类别进行汇总表达，例如某座桥梁的桩基、承台、墩身等会打包描述，用于整体进展展示。

但从实际进度管控场景看，现场仍然是围绕具体墩号进行管理和推进。因此，对于关键工程，客户期望细颗粒度计划能够拆解到墩号维度，便于支撑现场执行管控和进度跟踪。

3. 初版计划生成逻辑

针对初版计划生成过程进行了讨论。

在项目前期策划阶段，技术、工程及其他关键岗位人员会共同讨论施工计划，重点评估工效、资源配置、施工组织及其他特殊影响因素，并结合甲方或业主提出的工期要求，判断当前计划是否能够满足节点目标。

如果测算后发现工期不满足要求，项目团队会进一步讨论调整方案，例如优化施工顺序、增加资源投入、调整工效假设或重新组织关键工序安排。

4. 关键线路控制

客户反复强调，渠溪河特大桥是当前项目的关键线路，其他桥梁暂不属于关键线路。同时，某隧道由于安全管控原因目前停止掘进，也已转变为当前需要重点关注的线路。

可以看出，客户对项目关键线路有较明确的经验判断和管理认知，但关键线路的识别过程更多依赖项目管理经验，尚未形成系统化、可计算、可解释的识别机制。

5. 实际进度采集方式可行性

针对实际进度采集方式进行了讨论，客户反馈如下：

第一，微信群机器人自动采集方式不被认可。主要原因是基层微信群中包含大量现场照片及内部管理信息，部分内容不适合对外开放或被系统自动采集，在企业管理要求下存在合规和信息安全顾虑。

第二，由分包人员通过 APP 直接反馈实际进度的方式可行性较低。分包人员年龄普遍偏大，配合意愿和操作能力有限，目前仍更习惯通过微信文字方式进行进度反馈。

第三，由工程部统计人员或工区施工员进行二次加工记录的方式相对认可。客户认为，只要工区施工员能够及时记录实际进度，系统就可以有效减少后续进度统计、汇总和分析的工作量，具备实际落地价值。

6. 后续推进事项

本次沟通明确了两项后续工作：

1. 与工程部相关人员建立联系，便于后续进一步开展进度管控业务调研，深入了解实际管理流程、统计口径和现场执行方式。
2. 明确后续需要向项目总工进行汇报，推动项目内部进一步确认应用价值和试点推进安排。
